

รายละเอียดแผนการจัดสรรน้ำและส่งน้ำตามรอบเวร " ช่วงกรกฎาคม-สิงหาคม 2566 "

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปารณบุรี (สำหรับผู้ปฏิบัติ)

ตามมติที่ประชุม
4 ก.ค. 66

รายละเอียด : ฝ่ายส่งน้ำที่ 2, 3 และ 4 รับน้ำตามช่วงเวลา ส่งน้ำที่อัตรา 8 ลบ.ม. ต่อ วินาที จำนวน 18 วัน

*** (รอบเวรช่วง ก.ค.-ส.ค. 66 เน้นส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และสระประปาหมู่บ้าน)

วัน/เดือน/ปี	เวลา	การปฏิบัติงาน	ปริมาณน้ำ (ลูกบาศก์เมตร / วินาที)
24 ก.ค. 66	09:00 น.	เริ่มส่งน้ำจากต้นคลองส่งน้ำสายใหญ่ (กม.0+000) ไปยังอาคารอัดน้ำกลางคลอง กม.12 (เริ่มต้นรอบเวรช่วง ก.ค.-ส.ค. 66)	8 ลบ.ม. ต่อ วินาที
24 - 26 ก.ค. 66	ตลอดช่วงเวลาที่กำหนด (2 วัน)	ส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่ฝ่ายส่งน้ำที่ 2 โดยเน้นเพื่อการอุปโภค-บริโภค และสระประปาหมู่บ้าน (ปิดประตูอาคารอัดน้ำกลางคลอง กม.12)	8 ลบ.ม. ต่อ วินาที
26 ก.ค. 66	09:00 น.	เปิดประตูอาคารอัดน้ำกลางคลอง กม.12	8 ลบ.ม. ต่อ วินาที
26 - 28 ก.ค. 66	ตลอดช่วงเวลาที่กำหนด (2 วัน)	ส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่ฝ่ายส่งน้ำที่ 2 โดยเน้นเพื่อการอุปโภค-บริโภค และสระประปาหมู่บ้าน (ปิดประตูอาคารอัดน้ำกลางคลอง กม.19)	8 ลบ.ม. ต่อ วินาที
28 ก.ค. 66	09:00 น.	เปิดประตูอาคารอัดน้ำกลางคลอง กม.19	8 ลบ.ม. ต่อ วินาที
28 - 30 ก.ค. 66	ตลอดช่วงเวลาที่กำหนด (2 วัน)	ส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่ฝ่ายส่งน้ำที่ 2 โดยเน้นเพื่อการอุปโภค-บริโภค และสระประปาหมู่บ้าน (ปิดประตูอาคารอัดน้ำกลางคลอง กม.29)	8 ลบ.ม. ต่อ วินาที
30 ก.ค. 66	09:00 น.	เปิดประตูอาคารอัดน้ำกลางคลอง กม.29	8 ลบ.ม. ต่อ วินาที
30 ก.ค. 66 - 1 ส.ค. 66	ตลอดช่วงเวลาที่กำหนด (2 วัน)	ส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่ฝ่ายส่งน้ำที่ 3 โดยเน้นเพื่อการอุปโภค-บริโภค และสระประปาหมู่บ้าน (ปิดประตูอาคารอัดน้ำกลางคลอง กม.39)	8 ลบ.ม. ต่อ วินาที
1 ส.ค. 66	09:00 น.	เปิดประตูอาคารอัดน้ำกลางคลอง กม.39	8 ลบ.ม. ต่อ วินาที
1 - 3 ส.ค. 66	ตลอดช่วงเวลาที่กำหนด (2 วัน)	ส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่ฝ่ายส่งน้ำที่ 3 โดยเน้นเพื่อการอุปโภค-บริโภค และสระประปาหมู่บ้าน (ปิดประตูอาคารอัดน้ำกลางคลอง กม.46)	8 ลบ.ม. ต่อ วินาที
3 ส.ค. 66	09:00 น.	เปิดประตูอาคารอัดน้ำกลางคลอง กม.46	8 ลบ.ม. ต่อ วินาที
3 - 5 ส.ค. 66	ตลอดช่วงเวลาที่กำหนด (2 วัน)	ส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่ฝ่ายส่งน้ำที่ 4 โดยเน้นเพื่อการอุปโภค-บริโภค และสระประปาหมู่บ้าน (ปิดประตูอาคารอัดน้ำกลางคลอง กม.52)	8 ลบ.ม. ต่อ วินาที
5 ส.ค. 66	09:00 น.	เปิดประตูอาคารอัดน้ำกลางคลอง กม.52	8 ลบ.ม. ต่อ วินาที
5 - 7 ส.ค. 66	ตลอดช่วงเวลาที่กำหนด (2 วัน)	ส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่ฝ่ายส่งน้ำที่ 4 โดยเน้นเพื่อการอุปโภค-บริโภค และสระประปาหมู่บ้าน (ปิดประตูอาคารอัดน้ำกลางคลอง กม.58)	8 ลบ.ม. ต่อ วินาที
7 ส.ค. 66	09:00 น.	เปิดประตูอาคารอัดน้ำกลางคลอง กม.58	8 ลบ.ม. ต่อ วินาที
7 - 9 ส.ค. 66	ตลอดช่วงเวลาที่กำหนด (2 วัน)	ส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่ฝ่ายส่งน้ำที่ 4 โดยเน้นเพื่อการอุปโภค-บริโภค และสระประปาหมู่บ้าน (ปิดประตูอาคารอัดน้ำกลางคลอง กม.62)	8 ลบ.ม. ต่อ วินาที
9 ส.ค. 66	09:00 น.	เปิดประตูอาคารอัดน้ำกลางคลอง กม.62	8 ลบ.ม. ต่อ วินาที
9 - 11 ส.ค. 66	ตลอดช่วงเวลาที่กำหนด (2 วัน)	ส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่ฝ่ายส่งน้ำที่ 4 โดยเน้นเพื่อการอุปโภค-บริโภค และสระประปาหมู่บ้าน (น้ำเดินทางถึงปลายคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.65+170)	8 ลบ.ม. ต่อ วินาที
11 ส.ค. 66	09:00 น.	ยุติการส่งน้ำในพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำที่ 4 (สิ้นสุดการส่งน้ำรอบเวรช่วง ก.ค.-ส.ค. 66)	

รายละเอียดปริมาณน้ำที่ใช้ตามแผนการจัดสรรน้ำและส่งน้ำตามรอบเวร " ช่วงกรกฎาคม-สิงหาคม 2566 "

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปรางบุรี

รายละเอียด : ฝ่ายส่งน้ำที่ 2, 3 และ 4 รับน้ำตามช่วงเวลา ส่งน้ำที่อัตรา 8 ลบ.ม. ต่อ วินาที จำนวน 18 วัน

*** (รอบเวรช่วง ก.ค.-ส.ค. 66 เน้นส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และสระประปาหมู่บ้าน)

ตามมติที่ประชุม
4 ก.ค. 66


วัน / เดือน / ปี	จำนวน	อัตราการส่งน้ำ		พื้นที่ฝ่ายส่งน้ำ
	(วัน)	ลบ.ม. / วินาที	ปริมาณน้ำทั้งหมด (ลบ.ม.)	
24 ก.ค. 66 - 11 ส.ค. 66	18	8	12,441,600	ฝ่ายส่งน้ำที่ 2, 3 และ 4
รวม	18	-	12,441,600	-

หมายเหตุ


การส่งน้ำในรอบเวรช่วงกรกฎาคม-สิงหาคม 2566 นี้ ขอให้ทำการส่งน้ำในพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำฯ ตามลำดับ

โดยใช้การเปิดและปิดอาคารอัดน้ำกลางคลองในแต่ละช่วงเวลา ให้เป็นไปตามแผนการส่งน้ำที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

แผนภูมิแสดงแผนการส่งน้ำในช่วงสถานการณ์ภัยแล้งของอ่างเก็บน้ำปรางบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปรางบุรี



รอบเวรช่วงกรกฎาคม-สิงหาคม 66 (ตามมติที่ประชุม 4 ก.ค. 66)
 ส่งน้ำที่อัตรา 8 ลบ.ม. ต่อ วินาที จำนวน 18 วัน
 ตั้งแต่ 24 ก.ค. 66(09:00น.) – 11 ส.ค. 66(09:00น.)
 รวมใช้ปริมาณน้ำทั้งหมด 12,441,600 ลบ.ม.
 หมายเหตุ จะพิจารณาแผนส่งน้ำใหม่ เมื่อปริมาณน้ำในอ่างฯ ต่ำกว่า 15%

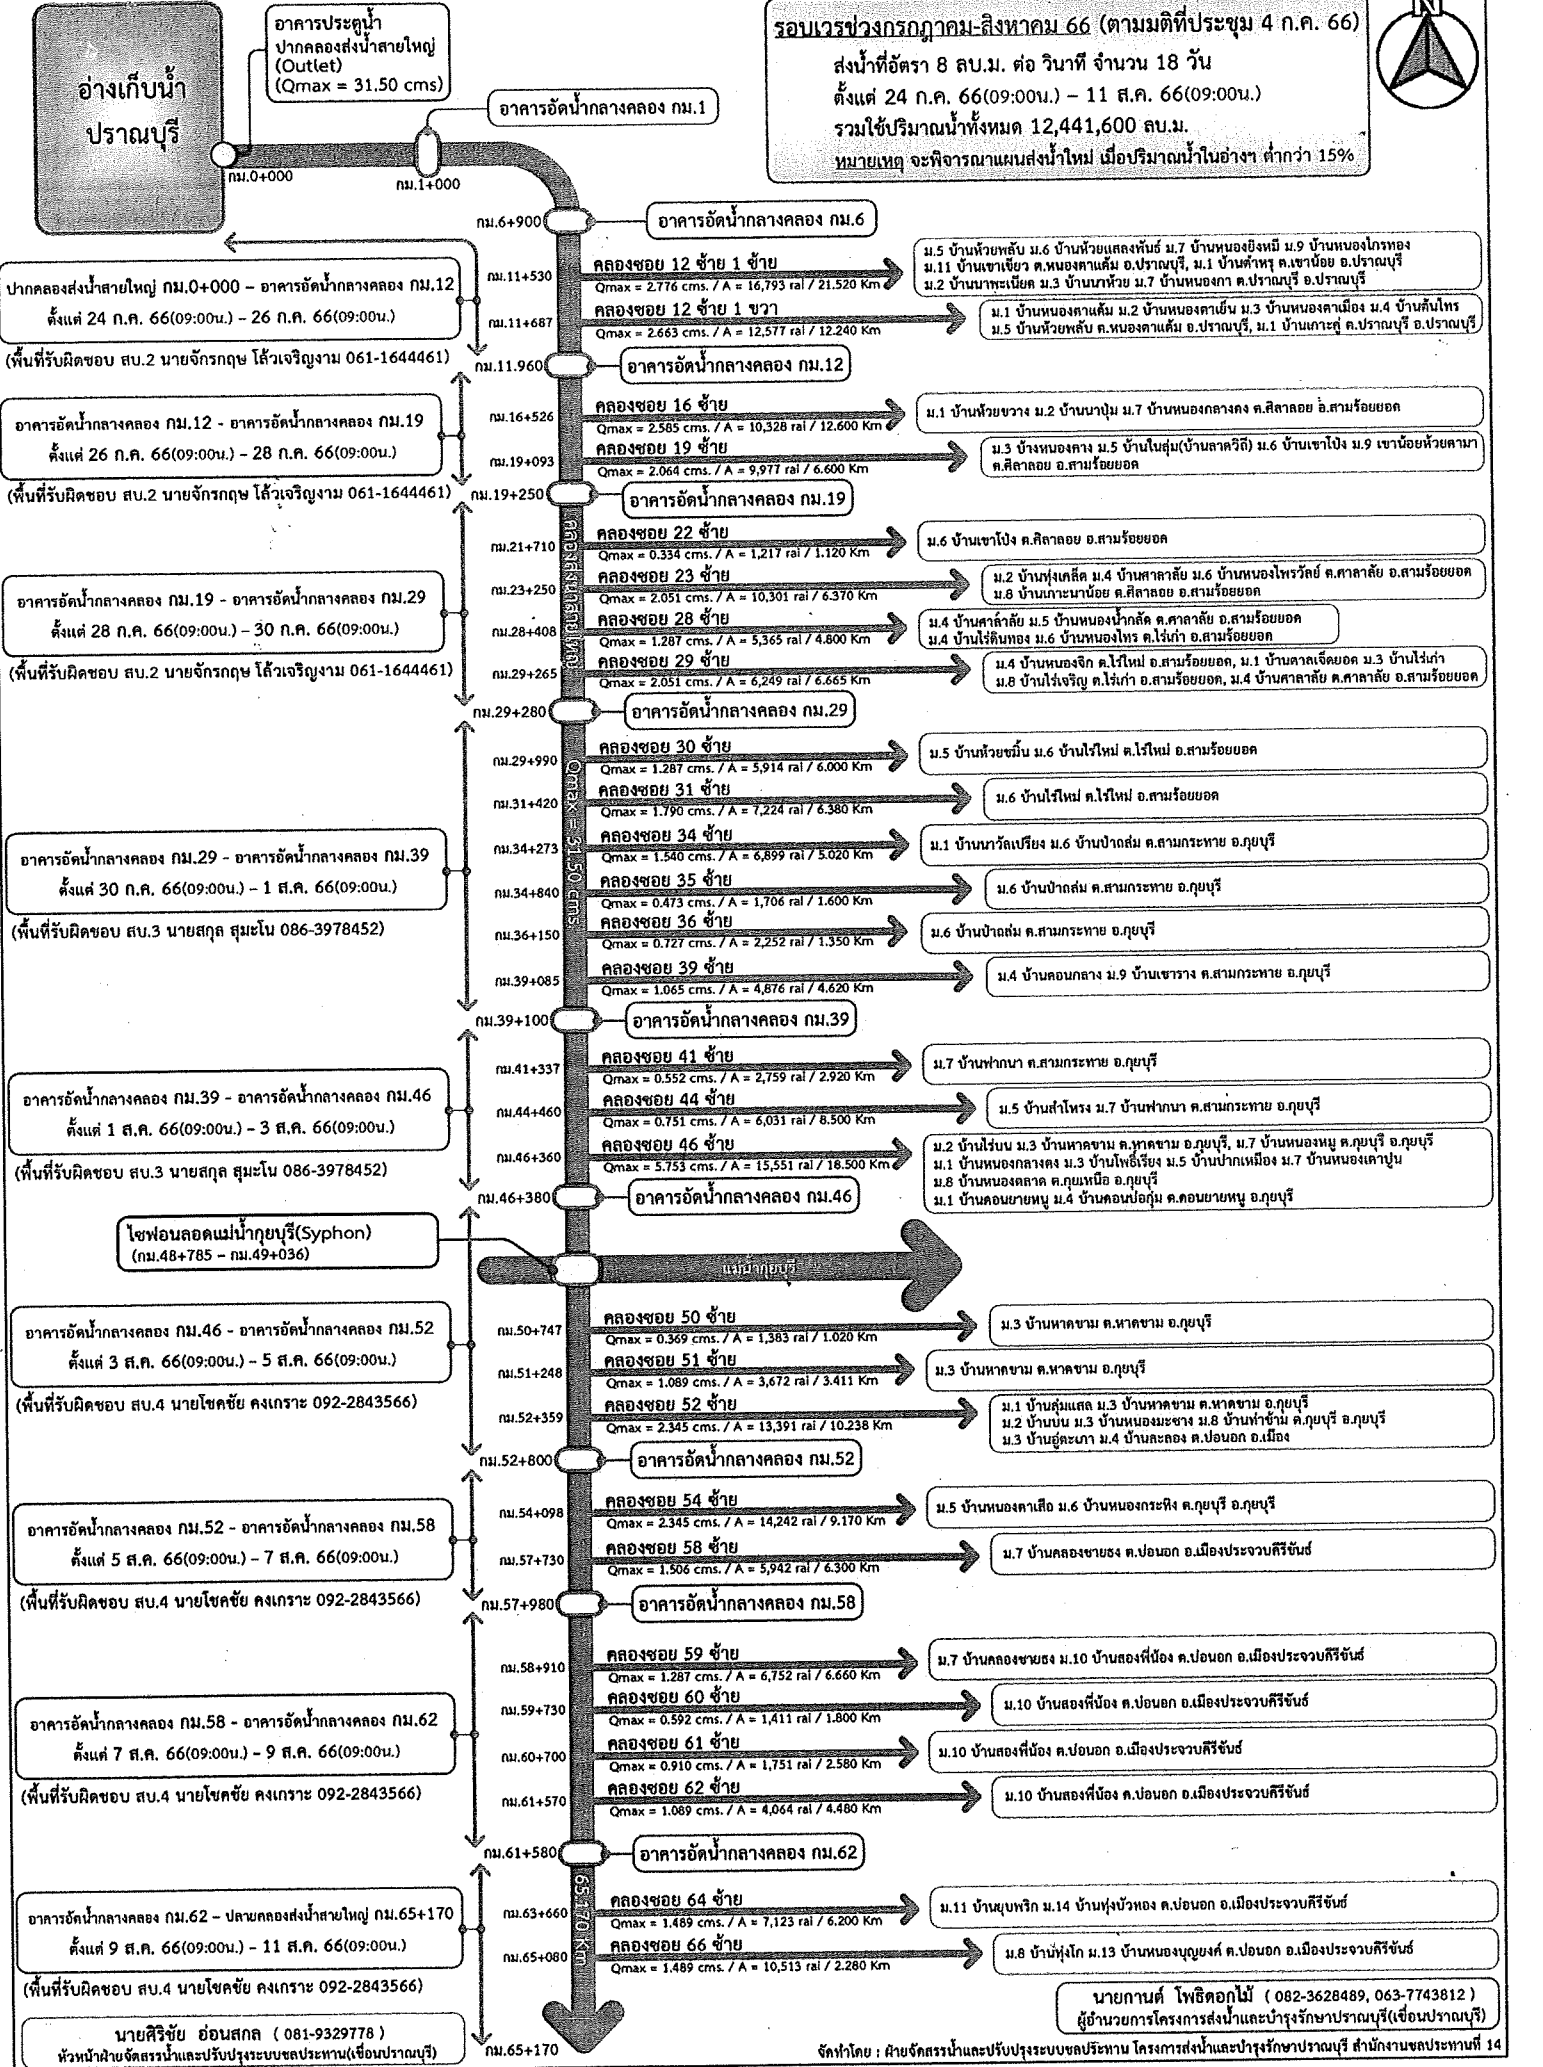

ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.0+000 – อาคารอัดน้ำกลางคลอง กม.12
 ตั้งแต่ 24 ก.ค. 66(09:00น.) – 26 ก.ค. 66(09:00น.)
 (พื้นที่รับน้ำ ผ.บ. 2 นายจักรกฤษณ์ ใต้เจริญงาม 061-1644461)

อาคารอัดน้ำกลางคลอง กม.12 – อาคารอัดน้ำกลางคลอง กม.19
 ตั้งแต่ 26 ก.ค. 66(09:00น.) – 28 ก.ค. 66(09:00น.)
 (พื้นที่รับน้ำ ผ.บ. 2 นายจักรกฤษณ์ ใต้เจริญงาม 061-1644461)

อาคารอัดน้ำกลางคลอง กม.19 – อาคารอัดน้ำกลางคลอง กม.29
 ตั้งแต่ 28 ก.ค. 66(09:00น.) – 30 ก.ค. 66(09:00น.)
 (พื้นที่รับน้ำ ผ.บ. 2 นายจักรกฤษณ์ ใต้เจริญงาม 061-1644461)

อาคารอัดน้ำกลางคลอง กม.29 – อาคารอัดน้ำกลางคลอง กม.39
 ตั้งแต่ 30 ก.ค. 66(09:00น.) – 1 ส.ค. 66(09:00น.)
 (พื้นที่รับน้ำ ผ.บ. 3 นายสุกฤษณ์ 086-3978452)

อาคารอัดน้ำกลางคลอง กม.39 – อาคารอัดน้ำกลางคลอง กม.46
 ตั้งแต่ 1 ส.ค. 66(09:00น.) – 3 ส.ค. 66(09:00น.)
 (พื้นที่รับน้ำ ผ.บ. 3 นายสุกฤษณ์ 086-3978452)

อาคารอัดน้ำกลางคลอง กม.46 – อาคารอัดน้ำกลางคลอง กม.52
 ตั้งแต่ 3 ส.ค. 66(09:00น.) – 5 ส.ค. 66(09:00น.)
 (พื้นที่รับน้ำ ผ.บ. 4 นายโชคชัย คงกระรา 092-2843566)

อาคารอัดน้ำกลางคลอง กม.52 – อาคารอัดน้ำกลางคลอง กม.58
 ตั้งแต่ 5 ส.ค. 66(09:00น.) – 7 ส.ค. 66(09:00น.)
 (พื้นที่รับน้ำ ผ.บ. 4 นายโชคชัย คงกระรา 092-2843566)

อาคารอัดน้ำกลางคลอง กม.58 – อาคารอัดน้ำกลางคลอง กม.62
 ตั้งแต่ 7 ส.ค. 66(09:00น.) – 9 ส.ค. 66(09:00น.)
 (พื้นที่รับน้ำ ผ.บ. 4 นายโชคชัย คงกระรา 092-2843566)

อาคารอัดน้ำกลางคลอง กม.62 – ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.65+170
 ตั้งแต่ 9 ส.ค. 66(09:00น.) – 11 ส.ค. 66(09:00น.)
 (พื้นที่รับน้ำ ผ.บ. 4 นายโชคชัย คงกระรา 092-2843566)

นายศิริชัย อ่อนสลก (081-9329778)
 หัวหน้าฝ่ายจัดการน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน (เขื่อนปรางบุรี)

นายกานต์ โพธิ์ตอกไม้ (082-3628489, 063-7743812)
 ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปรางบุรี (เขื่อนปรางบุรี)
